



Měření průvzdušnosti – Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-012397-ZáR

Rodinný dům
parc.č. 329, 2154/8
Horní Lomná

Zkušební laboratoř ATELIER DEK
akreditovaná
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565



L 1565

Zpracováno v období: červenec 2015

**Protokol o měření průvzdušnosti – Blower-Door test
ČSN EN 13829 – Metoda B**


- Předmět:** **Rodinný dům**
parc.č. 329, 2154/8
Horní Lomná
- Úkol:** Zkouška průvzdušnosti obálky budovy – Blower-Door test
- Objednatel:** **QUALITY HOUSE s.r.o.**
Samota 197
Olomouc - Slavonín, 783 01
- Kontaktní osoba: Milan Haboň
Tel.: +420 776 566 250
Email: habon@qhouse.cz
- Zpracovatel:** **Zkušební laboratoř ATELIER DEK**
č. 1565
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
Tel.: +420 234 054 284
Tel.: +420 234 054 285
Fax.:+420 234 054 291
- Vypracoval:** Ing. Roman Zápařka
- Kontroloval:** Ing. Roman Pavelka
- Podklady:** [1] Objednávka ze dne 26.6.2015
[2] Měření průvzdušnosti Blower-Door test
Datum měření: 9.7.2015 (cca 11:00 - 12:00)
Měření provedl: Ing. Roman Zápařka
[3] ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
[4] ČSN EN 13829:1999 (73 0577) Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda

**Protokol se bez písemného souhlasu laboratoře nesmí reprodukovat jinak než celý.
Naměřené hodnoty jsou platné pouze pro uvedený měřený prostor. Na základě výsledků
tohoto měření nelze hodnotit jiné objekty stejného nebo obdobného konstrukčního systému.**


Protokol o měření průvzdušnosti – Blower-Door test ČSN EN 13829 – Metoda B

Informace o objektu a měřícím zařízení

Měřený objekt: Jedná se o rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a vestavěným podkrovím. Objekt je koncipován jako dřevostavba. Obvodové stěny jsou tvořeny dřevěnou rámovou konstrukcí vyplněnou minerální vatou a kontaktním zateplovacím systémem. Hlavní vzduchotěsnící vrstvu (dále jen HVV) tvoří parotěsnící folie. Střešní konstrukce je zateplena mezi a pod krokvemi minerální vatou. Okna jsou plastová s izolačním trojsklem.

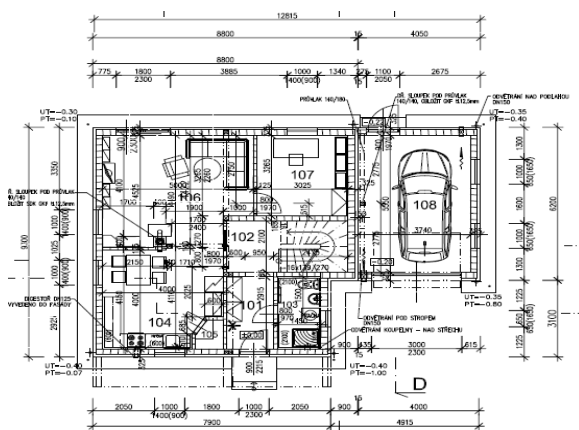

Obr. 1 – půdorys 1.NP

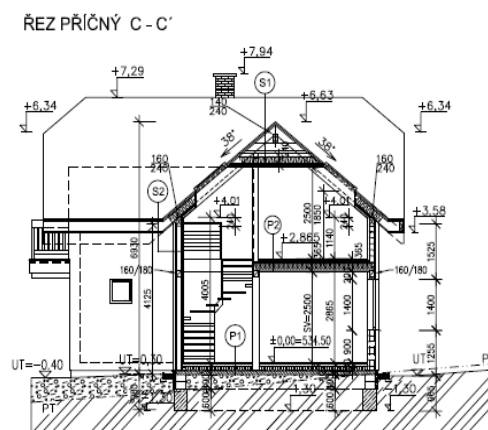

Obr. 2 – řez

Měřená část objektu: Obalové konstrukce

Vnitřní objem V: 362,4 m³

Větrací systém: přirozené
Způsob úpravy vzduchu: bez úprav vzduchu
Způsob vytápění: elektrické

Měřící zařízení:

Infiltec DM4 Micro-Manometer
 Termohydrograf Commeter D3631

Seriové číslo
 942308
 6910319

Protokol o měření průvzdušnosti – Blower-Door test

ČSN EN 13829 – Metoda B

Naměřená data a výsledky měření

Podmínky při měření:

Prům. vnitřní teplota vzduchu: 23,1 °C	Síla větru: 2° Beauforta
Prům. venkovní teplota vzduchu: 22,5 °C	Počet venkovních tlakových čidel: 1
Větrná expozice budovy: nechráněná	

Podtlak			Přetlak		
Základní tlakový rozdíl	Δp_{01}	Δp_{02}	Základní tlakový rozdíl	Δp_{01}	Δp_{02}
	0,2 Pa	-0,1 Pa		1,0 Pa	-1,0 Pa

Naměřené hodnoty:

Podtlak				Přetlak			
Clona ventilátoru	Tlakový rozdíl [Pa]	Objem. tok [m ³ /h]	Tolerance [%]	Clona ventilátoru	Tlakový rozdíl [Pa]	Objem. tok [m ³ /h]	Tolerance [%]
C6	14,5	59	1,1	C6	15,7	54	-1,2
C6	19,3	72	-0,6	C6	19,6	64	-2,4
C6	25,6	85	-5,5	C6	23,6	76	-0,4
C6	28,9	101	2,6	C6	28,8	92	2,4
C6	34,3	113	1,2	C6	34,4	109	4,7
C6	38,9	127	3,2	C6	40,0	119	1,2
C6	45,4	137	-0,9	C6	44,5	130	1,3
C6	51,5	151	-0,7	C6	49,4	136	-2,7
C6	54,0	159	0,8	C6	53,4	146	-2,0
C6	58,0	164	-1,5	C6	58,7	160	-1,2

Legenda:

X – bez clony C0 – nasazena clona bez zátek C3,4,5,6 – nasazena clona s příslušným počtem zátek


Parametry regresní křivky:

Korelační koeficient	0,9976	Korelační koeficient	0,9979
C_{env}	7,66	C_{env}	5,75
C_L	7,65	C_L	5,73
n	0,7584	n	0,8191

Výsledky měření:

	n₅₀ [1/h]
Podtlak	0,41
Přetlak	0,39
Střední hodnota	0,40

Protokol o měření průvzdušnosti – Blower-Door test
ČSN EN 13829 – Metoda B
Grafické výsledky

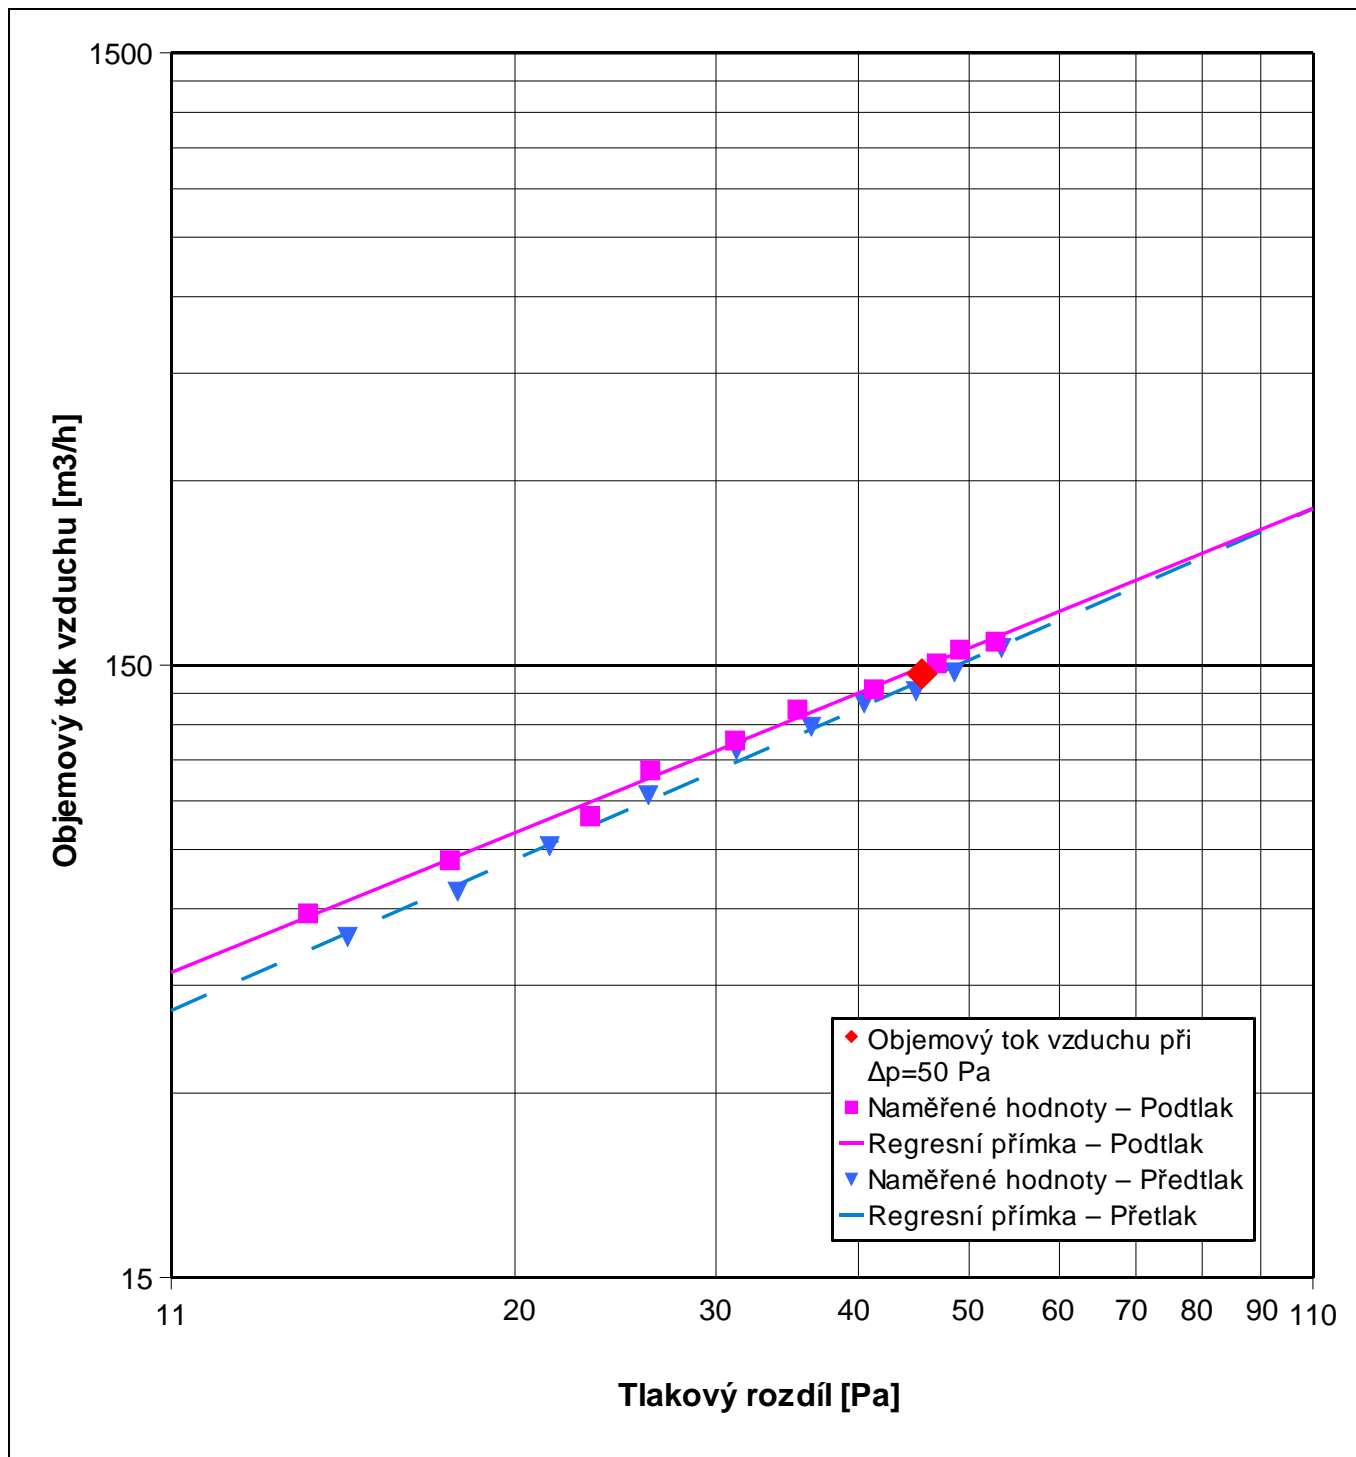

Protokol o měření průvzdušnosti – Blower-Door test
ČSN EN 13829 – Metoda B
Popis měření

Poloha měřicího zařízení:

Ve vchodových dveřích, plachta vzduchotěsně nalepena na ostění.

Stav objektu při měření:

Provedeny obalové konstrukce objektu, provedeny vzduchotěsnicí vrstvy, bez zařizovacích předmětů.

Dodatečně utěsněno pro účely měření dle ČSN EN 13829 [4] – Metoda B:

Utěsněné odpadní potrubí, vymetací otvor komína, utěsněn otvor pro napojení spotřebičů.

Nalezené nejvýznamnější netěsnosti

Netěsnosti ve spojích a kotvení parozábrany. Netěsná funkční spára u okna v podkroví. Netěsné spojení zasklívacích lišt u okna v podkroví.

Protokol o měření průvzdušnosti – Blower-Door test
ČSN EN 13829 – Metoda B
Hodnocení měření dle ČSN 73 0540-2 [3]

Nejvyšší doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2 [3], tab. 10

Větrání v budově	$n_{50,N}$ [1/h]	Měřený prostor
Přirozené nebo kombinované	4,5	◀
Nucené	1,5	
Nucené se zpětným získáváním tepla	1,0	
Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění (pasivní domy)	0,6	

Odhad nejistoty měření

Typ	Odhad nejistoty [%]
Odhad nejistoty objemového toku vzduchu	4,0
Odhad nejistoty měření tlakových rozdílů	1,0
Odhad nejistoty stanovení objemu měřeného prostoru	3,0
Odhad nejistoty při zanedbání skutečného tlaku vzduchu	5,0

**Naměřená hodnota intenzity výměny vzduchu při tlakovém
rozdílu 50 Pa změřená podle ČSN EN 13829 [4]**

$$n_{50} = 0,4 \quad 1/h \quad \pm \quad 8,1 \quad \%$$

Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pokrytí asi 95%.

**Porovnání hodnoty n_{50} stanovené měřením dle ČSN 13829 [4] s
doporučenou hodnotou $n_{50,N}$ dle ČSN 73 0540-2 [3]**

$$n_{50,N} > n_{50}$$

Výsledky měření splňují doporučení předpisu

V Olomouci dne 14.7.2015

za Zkušební laboratoř ATELIER DEK

Ing. Roman Pavelka

roman.pavelka@dek-cz.com



ATELIER DEK

DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
DIČ: CZ699000797

10



Pozn.: Naměřené hodnoty jsou platné pouze pro uvedený měřený prostor. Na základě výsledků tohoto měření nelze hodnotit jiné objekty stejného nebo obdobného konstrukčního systému.

< konec protokolu >
